

「改修工事が本格的になってきました」



校舎は足場とシートで囲われました。

上中祭のペイントが殺風景な景色に彩りを与えています。

2 学期に入り、改修工事が本格的になりました。正式には「上中中学校大規模改造工事（校舎・屋内運動場）」といいます。

工事終了予定は来年の 10 月で、STEP 1 から STEP 4 までの 4 工期に分かれて行われています。現在は STEP 1 の終期および STEP 2 の初期の段階です。

簡単に説明しますと、STEP 1 は、中央階段と（職員室は除く）保健室などの 1 階部分および体育館です。STEP 2 は、2・3 階の東部分（町体側）と引き続き体育館です。この部分が終われば 2, 3 年生は新しい教室に入ることができます。予定では 1 月中旬となっています。3 月の卒業式は照明が LED に変わり、フロアがきれいになった体育館で行われます。

STEP 3 は校舎中央部分で、2 階にはメディアセンターと呼ばれる、図書室、パソコン教室、会議室などの機能を備えた新しい空間が、3 階には理科室や多目的に使えるオープンスペースが誕生します。来年の 5 月が終了予定です。

最後の STEP 4 は西部分（中体側）および職員室です。ここが終わればすべての工事が終了です。終了予定は来年の 10 月末です。


毎週火曜日に、町教育委員会、設計事務所、工務店、学校関係者などが集まり、工程会議を行っています。学校は、その席上で、生徒の安全確保や学習環境の確保について意見を述べています。ゲートの設置、誘導員の配置、通学用通路の確保など安全面については最大の配慮をしてもらっています。ただ、工事で発生する騒音により、学習に影響が出ないかが心配です。現在、ハツリ工事といってコンクリートを砕いたり削ったりする作業が頻繁に行われています。この作業さえ終われば内装工事になるので、ある程度騒音はなくなると思います。

お子様から工事関係のことで、危険なことや不便なことをお聞きになられ、心配に思われることがありましたら学校までお知らせください。できる限り学校からの意見として会議で反映させてもらいます。当分の間、ご迷惑をおかけしますがご理解の程よろしくお願いします。

2017/9/25

NO.7

上中中学校ホームページもご覧ください

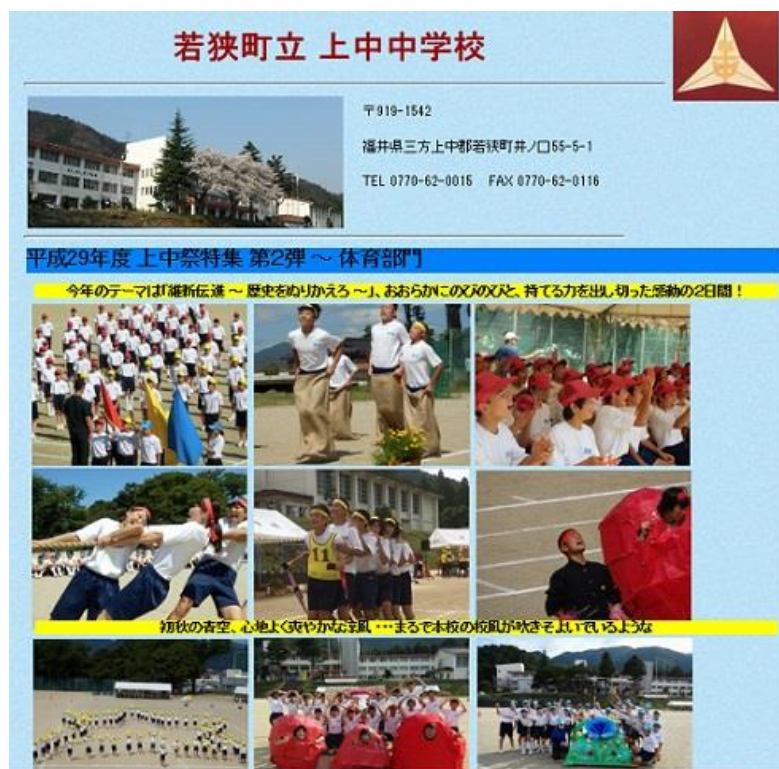

上中中学校の HP が充実してきました。

生徒の活躍する画像がトップページやフォトニュースに掲載されています。各種たよりでも紹介していますが、やはり HP からの画像が鮮明です。また、修学旅行や部活動の大会では Facebook を通してお知らせしています。

できたら「いいね」とフォローをしていただけると嬉しいです。

また、学校だよりや生徒指導だよりも随時アップしていきますので、見逃した方やお子様から渡されていない（そんなことはないと思いますが…^_^;）方もご覧ください。なお、年間行事予定は、年度初めのものですからあくまでも参考をお願いします。変更や確定した場合は改めてお知らせします。

Topics



今年度は職員におめでたが続きます。5月の松吉教諭の第三子誕生から、7月に世儀教諭（旧姓山下）の結婚、そして今月、竹村教諭とALTのアレックスが結婚されました。

家族が増えた喜びを胸に、さらに生徒に対しても愛情を注いでくれることでしょう。

おめでとうございます。

「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、秋分の日が終わり、めっきり秋めいてきました。また、「秋の日は釣瓶落とし」とも言い、日の暮れるのが早くなりました。学校では体調の管理や暗くなる下校時の交通安全に注意を払っていますが、ご家庭でも声掛けをよろしくお願いします。

